

リッキー通信

令和元年度 県単河川改修工事
姫三ダム下

第2版



発行者
(株)今井工務店

発行日
令和3年1月28日

はじめに



寒さもいちだんと厳しくなりましたが、近隣住民の皆様におかれましては、お健やかに
お過ごしのこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。

昨年11月より河川内の工事に着手させていただきましたが、皆様方のご協力のもと、
工事は順調に進んでおります。現在は全体の約80%が完了し、本工事のメインである
法覆護岸工に取り掛かっております。

近隣住民の皆様方には今後も、工事車両の走行等で、大変ご迷惑をお掛けしますが、
何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

工事概要



今回は、法覆護岸工(大型ブロック張)の作業手順を紹介します。



ブロック据付

重さ約1.2tのブロックを据付けます。




背面埋戻し

ブロック背面を砕石で埋め戻します。



胴込材挿入

ブロックの隙間に生コンを入れます。

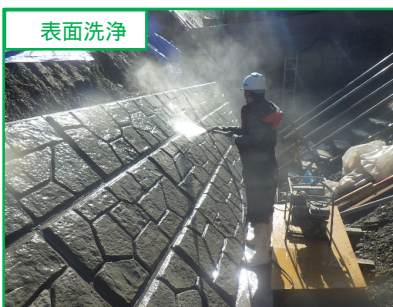

表面洗浄

表面に付着した生コンを洗います。



シート養生

コンクリートが急激に冷えるのを防ぐ
ためシートで覆います。

この作業を繰り返し、ブロックを
積み上げていきます。

現在は、8段目まで積み上がり
残り12段で護岸工は完成します。

今後も**安全第一**で
工事を進めてまいります。
